



GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE SACABA
Una Ciudad con Valor

*Sigamos
Adelante*

SANEAMIENTO BÁSICO

PARTE 1: ACTIVIDADES

PARTE 2: INVERSIONES



GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE SACABA
Una Ciudad con Valor

*Sigamos
Adelante*

PARTE 1: ACTIVIDADES EJECUTADAS SEGÚN PROGRAMACIÓN



GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE SACABA
Una Ciudad con Valor

*Sigamos
Adelante*

EMAPAS

SECTOR:	SANEAMIENTO BÁSICO
OBJETIVO GENERAL	AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SACABA

RESULTADOS OBTENIDOS



Programado: 550 medidores de agua se previo para la gestión 2022.

Resultado Obtenido: 442 Medidores se instalaron durante la gestión 2022.



Programado: Realizar durante la gestión 8 inspecciones a conexiones clandestinas

Resultado Obtenido: Se logro 9 inspecciones clandestinas en la gestión 2022.



RESULTADOS OBTENIDOS



Programado: 9 talleres de educación del agua para unidades educativas.

Resultado Obtenido: Se Efectuó 6 Talleres a Unidades Educativas para enseñar la importancia del uso y tratamiento del Agua.



Programado: Realizar 1450 conexiones de alcantarillado

Resultado Obtenido: Se realizo 1875 conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario, lográndose ampliar el área de cobertura.





GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE SACABA
Una Ciudad con Valor

*Sigamos
Adelante*

PARTE 2: INVERSIÓN

RESULTADOS OBTENIDOS



Programado: Se prevé la renovación de 2 tramos de agua potable.

Resultado Obtenido: Se renovó dos proyectos de Mosoj Llajta y San Juan de Dios del Distrito 4.



Programado: Ejecutar 2000 metros de red secundaria de Agua potable.

Resultado Obtenido: Se ejecutó 15,390.00 metros de red secundaria nueva de agua potable, para contar con infraestructura técnicamente adecuada para recibir las aguas de Misicuni.



RESULTADOS OBTENIDOS




**Programado: Ejecutar 14
Kilómetros de red de
alcantarillado.**

**Resultado Obtenido: Se ejecutó
27.06 Km de alcantarillado
sanitario ampliando el servicio y
llegar a mas familias sacabeñas
que demandan este servicio
básico.**



RESULTADOS OBTENIDOS

Figura 1: Lotes del proyecto

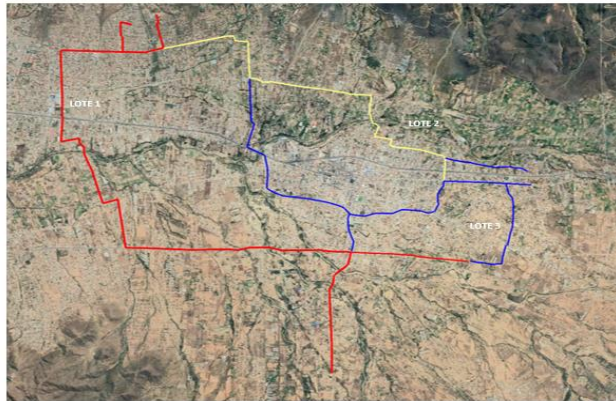

Resultado Obtenido: Se ha iniciado obras en la construcción Redes Primarias Sector Este teniéndose un avance de 10.33 Km de red primaria en los diferentes Lotes.

- **Son Tres empresas ejecutoras una por cada Lote**

PRESUPUESTO: Bs. 76,242,809.18
Longitud Total: Km 32.98
Beneficia a los Distritos 1,4,7 y parte de Lava Lava





GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE SACABA

Una Ciudad con Valor

*Sigamos
Adelante*

PARTE 3: OTRAS ACTIVIDADES

RESULTADOS OBTENIDOS



Resultado Obtenido: Se entrego la infraestructura e Inicio de Puesta en Marcha y estabilización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Pucara la cual es compacta y una de las modernas del País la cual beneficia a los distritos 1,4,7 y parte de Lava Lava.

Monto Inversión: Bs 22,347,700.11
Capacidad de Tratamiento: 150 l/s



RESULTADOS OBTENIDOS




Resultado Obtenido: Se entregó al ministerio para buscar financiamiento los proyectos.

➤ **IMPLEM. PLAN MAESTRO SANEAMIENTO BÁSICO DISTRITO LAVA LAVA (COMPRENDE PLANTA DE TRATAMIENTO Y COLECTORES PRINCIPALES).**

PRESUPUESTO: Bs. 26'383.106,15

➤ **CONST. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHIÑATA.**


PRESUPUESTO: Bs. 4'652.291,61

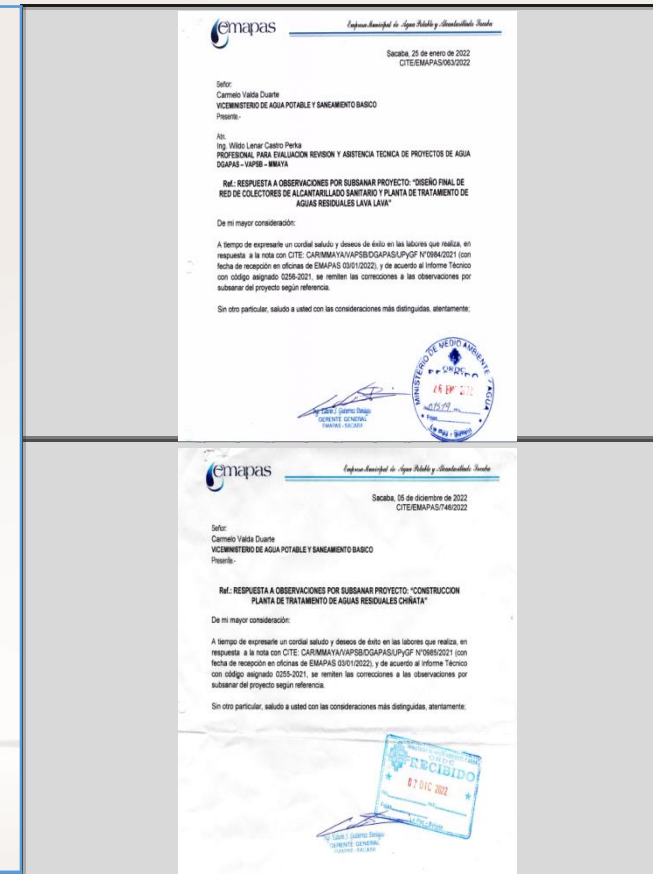

OTRAS ACTIVIDADES



Resultado Obtenido:
Implementación de Proyecto Piloto “Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas a pequeña Escala (STARD), en el Distrito 2, que complementara el plan de Descontaminación del Rio Maylanco.

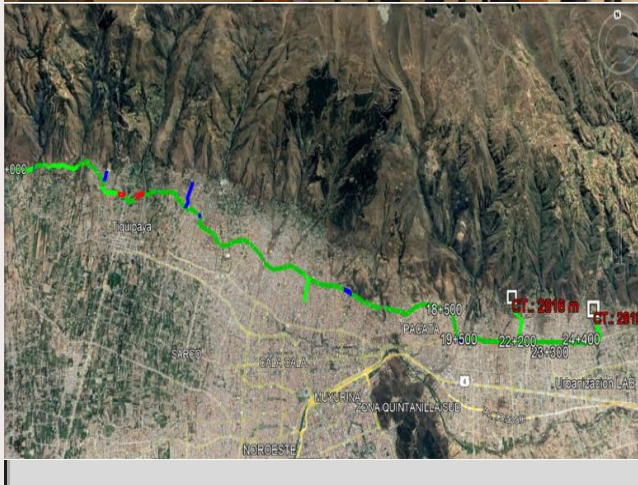

Resultado Obtenido: Seguimiento a la construcción de la aducción Jove Rancho-Sacaba.


ESTADO DEL PROYECTO.

- Ejecución Física 85%
- De los 24 km solo restan 650 m por ejecutar.
- Se tiene problemas sociales con Montecillo Bajo de Tiquipaya.

PRESUPUESTO: Bs. 249,536,155.19



OTRAS ACTIVIDADES

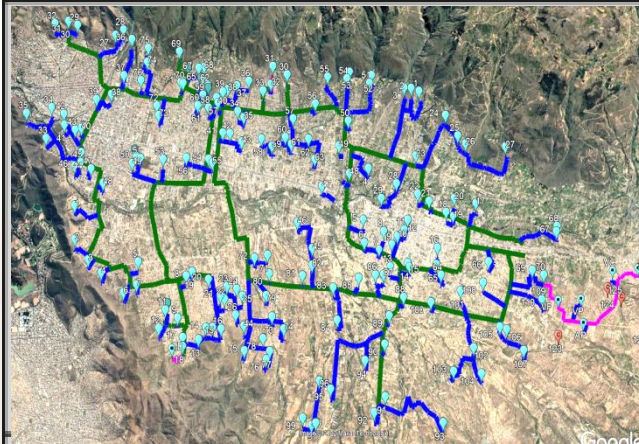

Resultado Obtenido: Se elaboro el proyecto a diseño final la cual se remitió al ministerio para la búsqueda de financiamiento.

Costo del proyecto: Bs. 81,194,516.34



Como arranque se inicio con un primer contrato para encarar 12 interconexiones en zonas de gran necesidad en el sector OESTE.

Monto Inversión: Bs. 1,584,766.17



OTRAS ACTIVIDADES

Estudiante de Promoción 6to A Estefany Maldonado
Unidad Educativa Técnico Humanístico Guadalupe



Resultado Obtenido: Se incentivo a la población estudiantil mediante un concurso de diseño de mural del cuidado del agua donde se brindo premios a los ganadores.



Resultado Obtenido: Participación de la forestación convocada por la secretaria de la madre tierra y desarrollo productivo del GAMS.

Una actividad de vital importancia y la única forma de combatir el cambio climático la cual es a través de la reforestación



OTRAS ACTIVIDADES



Resultado Obtenido: Se realizó el evento de la VI conferencia latinoamericana de saneamiento LATINOSAN BOLIVIA 2022.

La empresa y el Municipio de Sacaba por sus plantas de tratamiento de Aguas residuales con las que contamos somos un modelo en el país, por lo que fue considerado para este evento importante e internacional que sirve para intercambiar experiencias.





GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE SACABA
Una Ciudad con Valor

*Sigamos
Adelante*

PARTE 4: PRESUPUESTO INVERSIÓN EJECUTADO

CUADROS EJECUCIÓN INVERSIÓN INICIAL, PRIMERA ADENDA, SEGUNDA ADENDA

INVERSIÓN TRANSFERENCIA INICIAL

CAT. PROG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
110001 00	CONSTRUCCIONES (TRANSFERENCIA 2022)	4.393.377,00	3.556.762,24	93,78%	80.95%

INVERSIÓN PRIMERA Y SEGUNDA ADENDA

CAT. PROG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO REPROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
110001 00	CONSTRUCCIONES (TRANSFERENCIA 2022)	6.840.775,00	3.767.740,99	77,55%	55.07%
